


# Driftsättning och serviceprotokoll UV Safe



Datum:	
Objekt:	
Acticon ordernr:	
Serviceavtal:	

	Manöverpanel (UVM):
Serienummer:	
Bokstav (A-J)	

Driftsättning
  Service
  Reklamation

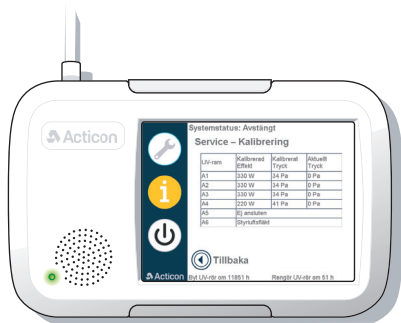

## Kalibrering vid forcerat/max flöde

Filterhus	Effekt (W)	Tryck (Pa)	Antal lysrör	Antal filterkassetter	Lyser alla dioder? (Ja/nej)
__1					
__2					
__3					
__4					
__5					
__6					

Ska UV lysa vid halvfart?  JA => startnivå=0% NEJ => startnivå=80%

Kod Servicemeny: 1992

Blå cirkel i flödesvisaren = UV lyser



## Test av driftfall

Filterhus	Lyser UV? Ja/Nej	Flöde				Larm? (nr)
		Max	(Halvfart)	(Lågfart)	Avstängt	
__1						
__2						
__3						
__4						
__5						
__6						

Centrala larm (filterhus ej angivet) ->

Signaler UVK	Funktion	Kopplat till
Ut 1 och 3	Inget larm	
Ut 2 och 3	Larm	
Ut 4 och 6	Inget underhållslarm	
Ut 5 och 6	Underhållslarm	
Ut 7 och 9	UV ej i driftläge	
Ut 8 och 9	UV i driftläget	
Ut 7 och 9	Timerfunktion ej aktiv	
Ut 8 och 9	Timerfunktion aktiv	
Ut 10 och 12	UV ej i drift	
Ut 11 och 12	UV i drift	
In 15 och 16	Enheten är master	Byglad
In 17 och 18	Förregling av systemet	Byglad

## Eventuella justeringar av grundinställning

	Default	Inställt
Fördröjning lågt tryck i UV-ram	300 s	
Startnivå	80% / 0%	
Larmnivå för lågt tryck i filterhus	80%	
Larmnivå för högt tryck i filterhus	125%	
Fördröjning till externt larm	30 min	
Rengöringsintervall	200 h	

## Genomfört av

Namn:	
Telefon:	
E-post:	
Företag:	

